Rapport d'avancement Travaux de Bureau EP Moma

Introduction

C'est depuis décembre 2009 que le comité de Parents avait été saisi de l'information de leur de St Nicolas de Bachem. Ils se sont réuni et ont décidé d'affecter cet argent à la construction du Bureau de l'école ave des briques cuites et les **Mpete** : genre de chaume spéciale qui peuvent facilement durer plus de 10 ans si reçoit de la fumée du bois. Une marche de réjouissance que l'on pouvait facilement retrouver les parents, les enseignants et les villageois fut organisée pour manifester leur satisfaction.

1. **Déroulement**

   Après avoir confirmé le transfert d'argent **500 €,** il fallait aller passer commande des chaumes dans les villages où on retrouvait ces chaumes dans leurs forêts car il fallait les couper, les sécher dans la forêt et les faire sortir de la forêt au village des coupeurs puis les transporter de ces villages jusqu'à l'école primaire Moma et enfin les monter sur la charpente de la toiture en bois. La toiture avait été complètement finie.

Le jour de fête scolaire, les parents sont entrain de suivre les jeux des enfants à partir de la salle du futur bureau de l'école.

2. Fabrication des briques cuites

Nous devrions aller retirer la presse qui se trouvait à Ikela pou la fabrication des briques à cuire. On a construit un hangar de stockage et les briques ont été stockées là car avant de le cuir, il faut que ca soit complètement séchées pour éviter les pertes au four. Il y avait du temps qui était passé et les briques été cuites. La location de la machine et le complément des nourritures et savons pendant les travaux de la fabrication des briques, coupe des bois de chauffage et frais des techniciens pour le montage de four.

3. **Commande des meubles**

Pendant que l'on se préparait pour la toiture et la fabrication des briques, on a passé commande des 02 tables dont une table du Directeur avec une table de **08 places** pour les réunions des enseignants et directeurs, **les 10 chaises** en bois et **03portes**. Elles sont fabriquées et stockées et attendant la fin complète du bureau pour équipement.

La partie restante est destinée évaluée à le reste sera complété pour le dédommagement de l'énergie des techniciens qui élèvent les murs de ce bâtiment.

Rapport Financier

N°	Désignation	Entrée	Sortie	Solde
01	-Virement **500€** et échange en **$**	**660 $**	**-**	**660$**
02	-Achat et transport de 1500 parties des chaumes 0 ,1$	**-**	**150$**	**510$**
03	-Achat 10 chaises en bois	**-**	**80 $**	**430$**
04	- 01Table en bois de 10 chaises	**-**	**50 $**	**380$**
05	- 01 Table en bois de bureau pour Directeur	**-**	**30 $**	**350$**
06	- 03 portes en bois	**-**	**75 $**	**275$**
07	- Dédommagement des briquetiers et technicien pour le montage de fours et achat une partie de bois de chauffage 25 stères sur 40	**-**	**180$**	**95S**
09	- Pour dédommagement des maçons pour élévation des murs et enduit interne et externe.	**-**	**95 $**	**00**

4. Difficultés rencontrées

La position du bureau par rapport à l'emplacement actuel doit changer pour être implanté dans l'emplacement définitif car on vient de prolonger le terrain.

Panne de notre appareil digital pour balancer les images de l'avancement des travaux mais nous nous organisons pour louer un appareil photo numérique, voire un photographe mécanique pou nous produire des cartes photos et vous envoyer les images.

Participation locale

Les parents des enfants ont participé dans le transport de chaumes, transport des briques, négociation de la location des presse à brique, coupe des stères de bois et transport de l'eau et de l'argile ;

Année 2010-2011 (Année encours)

L'effectif des enfants s'élève à 160 car ils ont organisé la sixième classe.

Les enseignants malgré qu'ils ne soient pas encore mécanisés par l'Etat se contentent des petits dons en natures maniocs, bouteilles d'huile qu'ils reçoivent de la part des parents.

Ils entretiennent une grande cour pour les jeux football et autres jeux. Mais les deux autres classes de 5 è et 6 ème année étudient dans les hangars provisoires et ne sont pas assis sur les bancs.

Arrivée d'un colis des habits envoyé pour les élèves à partir de Belgique

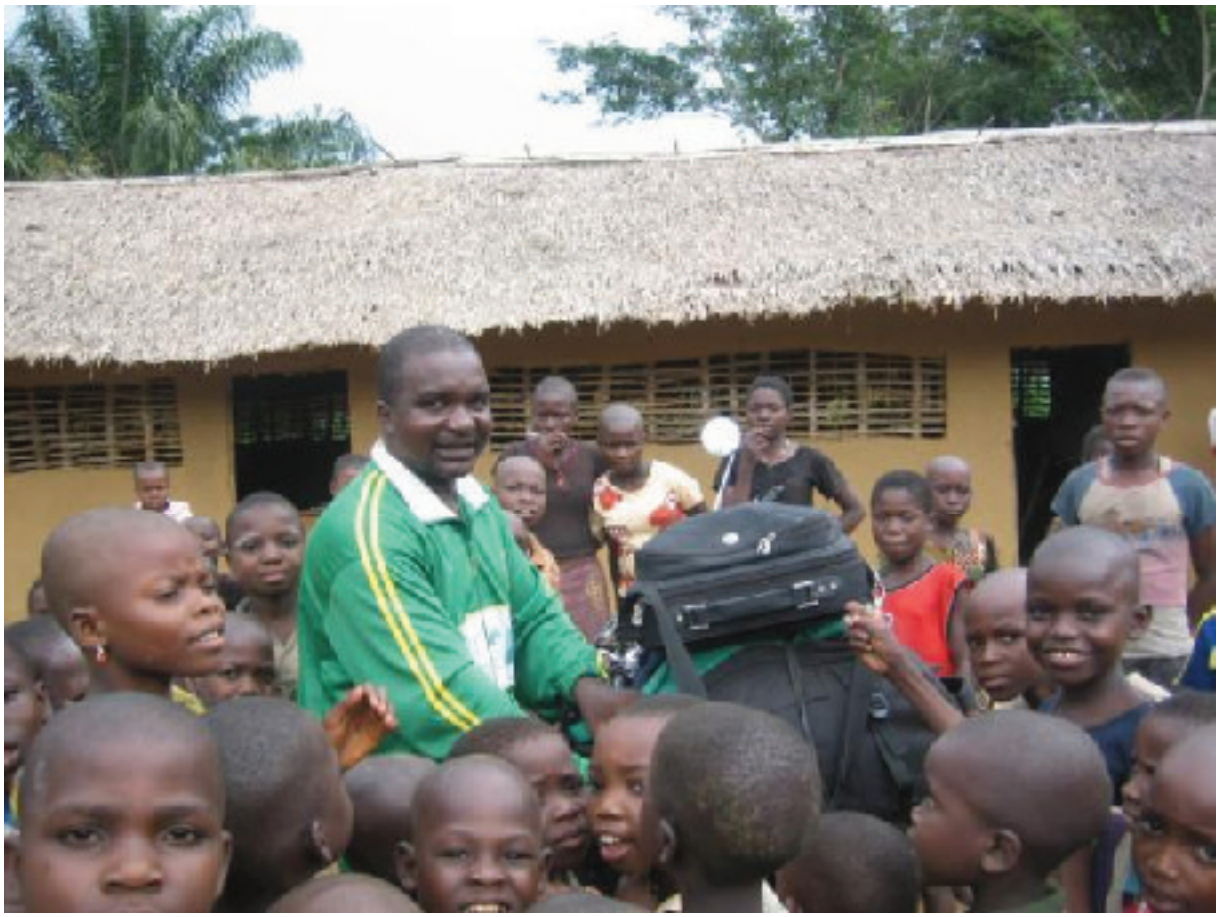

Les efforts de cette année seront orientés pour la construction de deux salles classes équipées des bancs.

Déballage du colis devant les enfants

Défilé

Marche de joie

Pendant les fêtes Scolaires

4. Conclusion :

Les travaux sont avancés au point que le bureau sera utilisé avant la fin de cette année scolaire.

Nous remercions de tous nos cœurs les membres de St Nicolas Bachem. Car leu contribution avaient donné la chance à la population d'avoir un peu de sous pour leurs ménages et les artisans du village ont trouvé du travail.

V**otre geste a contribué à l'éducation morale des enfants par des bonnes habitudes qui vont plaire à St. Nicolas, le Serviteur de Dieu et Ami des petits enfants. Depuis que l'on montrer les images de St Nicolas, on a raconté son histoire, tous les enfants veulent mériter la crédibilité de St Nicolas**

Pour clore, une bonne nouvelle pour l'école primaire Moma depuis le 1O septembre 2010, elle vient d'être reconnue par le Ministère national de

l'enseignement Primaire et maternel. Elle est comptée parmi les écoles du Congo que le gouvernement reconnaît.

Nous remercions le Bon Dieu qui a fait que cette école des enfants de pauvres soit citée dans la liste.

Nos remerciements à tout le monde qui a contribué de loin ou de près pour que cette école soit viable. Que le Bon Dieu leur accorde une santé de fer, prospérité, longévité et succès dans leurs occupations

Fait à Ikela le 20 / Novembre 2010

Pour le Comité des Parents, les Enseignants et les enfants de l'EP Moma

Roger Enyeka Bofululu : **Facilitateur /Promoteur**
